#### PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)

Nome do Projeto: JOGO DA ONÇA



Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO TROITINO

Controle de Versões						
Versão Data Autor Notas da Revisão						
1.0 08/09/2023 Criação do Documento						

1	OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO	. 2
2	ESCOPO DO PROJETO	. 2
3	ORGANIZAÇÃO DO PROJETO E MATRIZ DE RESPONSABILIDADE	. 5
4	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DO PROJETO	. 7
5	GESTÃO DE RISCOS E PROBLEMAS	. 9
6	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	11

# PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP) Nome do Projeto: JOGO DA ONÇA Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO TROITINO

#### 1 OBJETIVOS DESTE DOCUMENTO

Este documento visa estabelecer claramente os objetivos do PGP, delineando as metas e diretrizes que guiarão a execução de um projeto. O PGP, juntamente com os Planos de Gerenciamento complementares, serve como um mapa para as equipes de projeto, garantindo que todos os envolvidos compreendam o que precisa ser feito e como alcançar os resultados desejados

#### 2 ESCOPO DO PROJETO

#### 2.1 ESCOPO

O jogo da onça é um jogo de tabuleiro de origem indígena brasileira jogado no chão, com o tabuleiro traçado na areia e usando-se pedras como peças. Tratase de um jogo de estratégia para dois jogadores, composto por uma onça e 14 cães. O objetivo do jogador que controla a onça é comer os cães e o jogador que atua com os cachorros tem o objetivo de encurralar a onça e deixá-la sem possibilidade de movimentação.

O projeto a ser desenvolvido é uma adaptação do jogo tradicional dentro dos meios digitais, mais especificamente através da internet, dentre as demais ideias elaboradas em equipe, temos o objetivo de respeitar sua cultura e regras, realizando apenas pequenas implementações que possam deixar o jogo divertido e entretivo para os jogadores.

O jogo conta com 4 níveis, onde a cada nível o jogador desbloqueia um novo bioma, pela ordem hierarquica (amazônia, caatinga, mata atlântica e Pantanal) o seu design nos trás aspectos de uma floresta e conta com uma adição sonora, reproduzindo uma melodia no ambiente que possa nos reelembrar a passagem pela floresta e com sons ativados de acordo com os movimentos de cada jogador.

2

## PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)

Nome do Projeto: JOGO DA ONÇA






As arenas e os personagens disponíveis serão desenvolvidos através da PixelArt, disponibilizados ao decorrer dos níveis, serão fornecidos 12 skins que representam os cachorros e a onça em determinadas fases do jogo, sendo 1 de cada personagem para cada arena e 2 de cada personagens para temporadas especiais como halloween e natal.

A monetização é realizada atráves da compra por moedas raras e moedas normais que possibilitam o jogador a realizar a compra das skins dentro do aplicativo.

Afim de mantermos a diversão, foram elaboradas duas ideias, a primeira é que um jogador possa interagir com o seu oponente através de reações enquanto jogam, contendo cinco opções (feliz, bravo, surpreso, cachorro, onça). Além disso, serão disponibilizados emblemas de conquista, que o jogador poderá desbloquear após completar determinada missão dentro do jogo.

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Nome do Projeto: <b>JOGO DA ONÇA</b>	Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

## 2.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

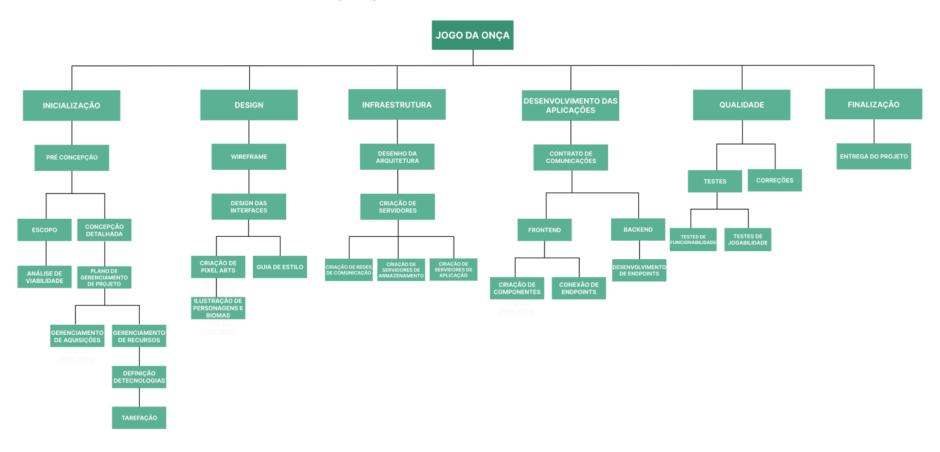

\_\_\_\_\_

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	<b>TFATEC</b>
Nome do Projeto: JOGO DA ONÇA	Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

## 3 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO E MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

#### 3.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES


Organograma RACI	anograma RACI Colaborador								
Atividade	Analice	José	Julia	Leandro	Lucas L	Lucas M	Paulo	Vinicius	Yuri
Análise de Viabilidade	R/A	С	С	С	С	С	С	С	С
Elaboração do PGP	R/A	I		I	ı			-	R
Elaboração do cronograma	R/A	I		I	ı			-	R
Elaboração do cronograma de custos	R/A	I	- 1	1	ı	- 1	I	1	R
Elaboração de diagramas e dicionários de dados	А	I	ı	С	I	I	I	R	С
Definição de Tecnologias	Α	R	R	1	R	R	R	1	
Tarefação	Α	С	U	С	С	C	С	C	С
Criação das ilustrações de Personagens	А	ı	-	I	R	C	С	-	I
Criação das ilustrações de Biomas	Α	I	ı	1	С	R	С	1	- 1
Guia de Estilo	Α	I	- 1	1	R	С	С	1	- 1
Criação de Redes de Comunicação	Α	R	R	- 1	С	С	С	- 1	I
Criação dos servidores de Armazenamento	А	R	R	I	С	С	С	1	I
Criação de Servidores de aplicação	Α	R	R	I	С	C	С	- 1	1
Criação de Componentes (FRONT END)	А	I	1	I	R	С	R	I	I
Conexão dos Endpoints (FRONT END)	Α	I	1	- 1	R	С	R	- 1	I
Desenvolvimento de Endpoints (BACK END)	А	R	R	I	С	С	С	I	I
Aplicação de Testes de Funcionabilidade	R/A	С	С	R	С	C	С	R	R
Aplicação de Testes de Jogabilidade	R/A	С	C	R	С	C	С	R	R
Correção de desenvolvimento	Α	R	R	С	R	R	R	С	С
Finalização do Projeto	Α	R	R	R	R	R	R	R	R

R = Responsável pela execução, A = Responsável pela aprovação, C = Aquele que é consultado, I = Aquele que é informado

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	TFATEC
Nome do Projeto: JOGO DA ONÇA	Faculdade de Tecnología do Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

## 3.2 DIVISÃO DAS EQUIPES

Equipe	Participantes		
Desenvolvimento Backend	Julia Santos		
Desenvolvimento backeno	José Thomaz		
	Lucas Lima		
Desenvolvimento	Paulo Marques		
FrontEnd	Lucas Marques		
	Vinicius Sousa		
Documentação	Yuri Martins		
Testes	Leandro Oliveira		
Gestão do Projeto	Analice Souto		




# 4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DO PROJETO

#### 4.1 ATIVIDADES E PRAZOS

ATIVIDADES	DIAS ESTIMADOS
Designação de responsabilidades, definição do Escopo.	7 Dias
Termo de abertura do Projeto – TAP	7 Dias
Estrutura Análitica do Projeto – WBS	14 Dias
Criação do Wireframe	7 Dias
Definição de equipamentos, infraestrutura, softwares e licenças necessárias (stack do projeto).	7 Dias
Definição das regras de negócio que devem ser atendidas no jogo, valores, emblemas etc	7 Dias
Criação da Guia de Estilo	1 Dia
Criação do Design das Interfaces	6 Dias
Desenvolvimento Página de login/Cadastro e "Esqueci minha senha" (Back End)	0 Dias
Desenvolvimento Página de login/Cadastro e "Esqueci minha senha" (Front End)	2 Dias
Desenvolvimento Página da Conta do usuário (Back End)	8 Dias
Criação websocket (Back End)	0 Dias
Criação Lógica do Jogo	5 Dias
Plano de Gerenciamento do Projeto	80 Dias
Ilustração de Personagens e Biomas	41 Dias
Desenvolvimento Página Loja de Moedas (Front End)	34 Dias
Desenvolvumento Página da Home (Front End)	35 Dias
Desenvolvimento Página Loja de Skins (Front End)	34 Dias
Desenvolvimento Loja (Back End)	4 Dias
Desenvolvimento Página de Coleção (Back End)	15 Dias
Desenvolvimento Página de Coleção (Front End)	28 Dias
Desenvolvimento Página da Conta do usuário (Front End)	25 Dias
Desenvolvimento Tabuleiro do jogo (Back end)	19 Dias
Desenvolvimento Tabuleiro do Jogo (Front End)	23 Dias
Escrita de casos de teste	21 Dias
Documentação Técnica do Projeto	35 Dias
Revisão de Estrutura e componentes CSS	23 Dias
Execução de casos de teste	21 Dias
Correções e finalização	7 Dias
Entrega do projeto	3 Dias

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	<b>TFATEC</b>
Nome do Projeto: <b>JOGO DA ONÇA</b>	Faculdade de Tecnología do Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

#### 4.2 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

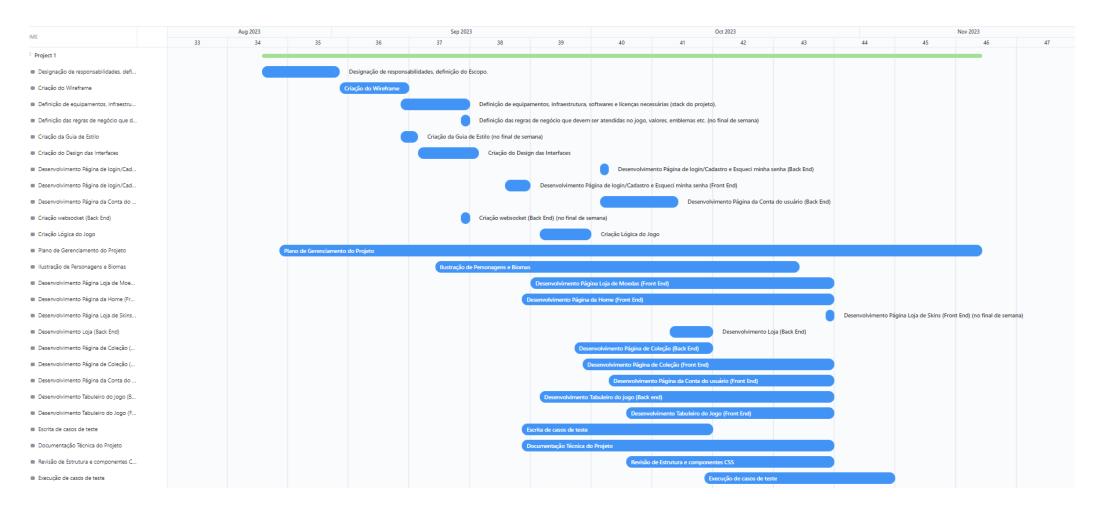

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	<b>TFATEC</b>
Nome do Projeto: <b>JOGO DA ONÇA</b>	Faculdade de Tecnología do Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

### 5 GESTÃO DE RISCOS E PROBLEMAS

#### 5.1 MATRIZ DE RISCOS

Impacto Probabilidade	Sem Impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
Alta					
Média					Qualidade insuficiente
iviedia					Problemas de conectividade
Baixa				Atraso no Cronograma	Conexão de diferentes camadas/componentes
Rara			Mudanças de Requisitos		

\_\_\_\_\_

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	<b>TFATEC</b>
Nome do Projeto: <b>JOGO DA ONÇA</b>	Faculdade de Tecnologia de Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

## 5.2 GESTÃO DE RISCOS

Risco	Ação Preventiva	Possível Ação Corretiva	
Atraso no Cronograma	Comunicação contínua entre GP e equipes a fim de acompanhar se as ações realizadas então de acordo com o cronograma	Remanejar membros de outras equipes para as equipes que possuem atividades em atraso	
Mudanças de Requisitos	Garantir que todas as mudanças idealizadas serão consultadas e aprovadas pelo GP, que ao aproválas, está ciente de seus possíveis impactos na qualidade e prazos do projeto	Remanejar membros de outras equipes para as atividades novas que forem criadas a partir de novos requisitos.	
Conexão de diferentes camadas/componentes	Comunicação entre os times para garantir que componentes que estejam sendo desenvolvidos utilizem tecnologia compatível.	Substituir as componentes/tecnologias utilizadas a fim de encontrar outra com maior compatibilidade.	
Qualidade insuficiente	Realizar teste no jogo (antes mesmo do fim do desenvolvimento) a fim de verificar se os componentes já desenvolvidos estão de acordo com aqueles definidos no Plano de Gestão da Qualidade	Casos os testes não alcancem a qualidade pré-estabelecida, deverão ser reenviados ao time de desenvolvimento para a realização das correções apontadas.	
Problemas de conectividade	Iniciar os testes de conexão com antecedência afim de identificar possíveis problemas.	Fazer as alterações nos componentes ou na tecnologia empregada para conexão.	

10

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Nome do Projeto: <b>JOGO DA ONÇA</b>	Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

# 6 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

# 6.1 CRONOGRAMA DE COMUNICAÇÕES

Legenda	Importância	Quando?	Onde?	Urgência	Impacto	Comentários
Descrição	Impacto	Periodicidade	Onde serão realizadas	Urgência da disponibilização da informação	Impacto da não entrega da informação	
Reunião alinhamento	Médio	Semanalmente	Online	Baixa	Baixo	Reunião semanal do GP com membros para alinhar tarefas e acompanhamento do cronograma
Reunião com patrocinador	Alto	Data a ser definida pelo patrocinador	Presenciais ou online	Baixa	Médio	Reunião com patrocinador para acompanhamento da equipe e do projeto.

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)	<b>FATEC</b>
Nome do Projeto: <b>JOGO DA ONÇA</b>	Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
Patrocinador(es) do Projeto: VICTOR ANTONIO TROITINO	

Aprovações					
Participante	Assinatura	Data			
Patrocinador do Projeto					
Gerente do Projeto					
